



График производства работ по объекту: "Строительство стартового 25-ти этажного жилого дома, г.Красногорск, ул.Вокзальная, д.№4"

Заказчик:  
 ООО "Финанскапитал"  
 Местный филиал  
 М.А. Мельников Н.А.

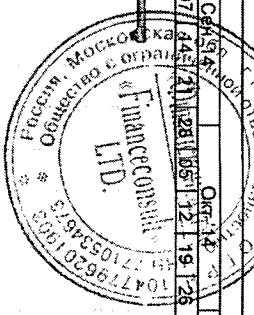

Наименование работ	Начало	Окончание	Срок работ
Демонтеральные работы	Чт 22.05.14	Пн 15.09.14	85 дней
Кладка наружных стен	Чт 22.05.14	Пт 11.07.14	38 дней
Кладка внутренних стен и перегородок в квартирах под переселение	Чт 22.05.14	Чт 12.06.14	16 дней
Кладка внутренних стен и перегородок	Чт 22.05.14	Чт 31.07.14	53 дней
Устройство кровли на стилобатной части здания	Пн 26.05.14	Чт 19.06.14	20 дней
Устройство основной кровли здания (отм.+79,000 м., 82,000 м.)	Пн 26.05.14	Чт 10.07.14	35 дней
Монтаж металлоконструкций на кровле (переходные мостики, пожарные лестницы, каркасы вентшахт)	Чт 12.06.14	Пн 28.07.14	35 дней
Монтаж защитного металлического ограждения кровли	Пт 20.06.14	Ср 06.08.14	35 дней
Монтаж накрывной плиты парапета из оцинкованной стали	Пн 07.07.14	Чт 14.08.14	30 дней
Заполнение оконных проемов окнами из ПВХ профиля	Пт 04.07.14	Чт 17.07.14	10 дней
Заполнение дверных проемов на переходных балконах лестничных клеток	Пт 01.08.14	Пт 05.09.14	26 дней
Заполнение дверных проемов противопожарными дверями (МОП, технич.помещения, служебные помещения)	Пн 14.07.14	Чт 28.08.14	35 дней
Заполнение дверных проемов в квартирах деревянными дверями	Чт 12.06.14	Пн 18.08.14	50 дней
Внутренняя отделка квартир под переселение	Пн 02.06.14	Ср 20.08.14	60 дней
Внутренняя отделка МОП и технических помещений	Чт 22.05.14	Пн 15.09.14	85 дней
ручная отделка фасадов:	Пн 26.05.14	Вт 19.08.14	64 дней
Облицовка 1-го и 2-го этажей керамогранитом	Пн 09.06.14	Чт 17.07.14	30 дней

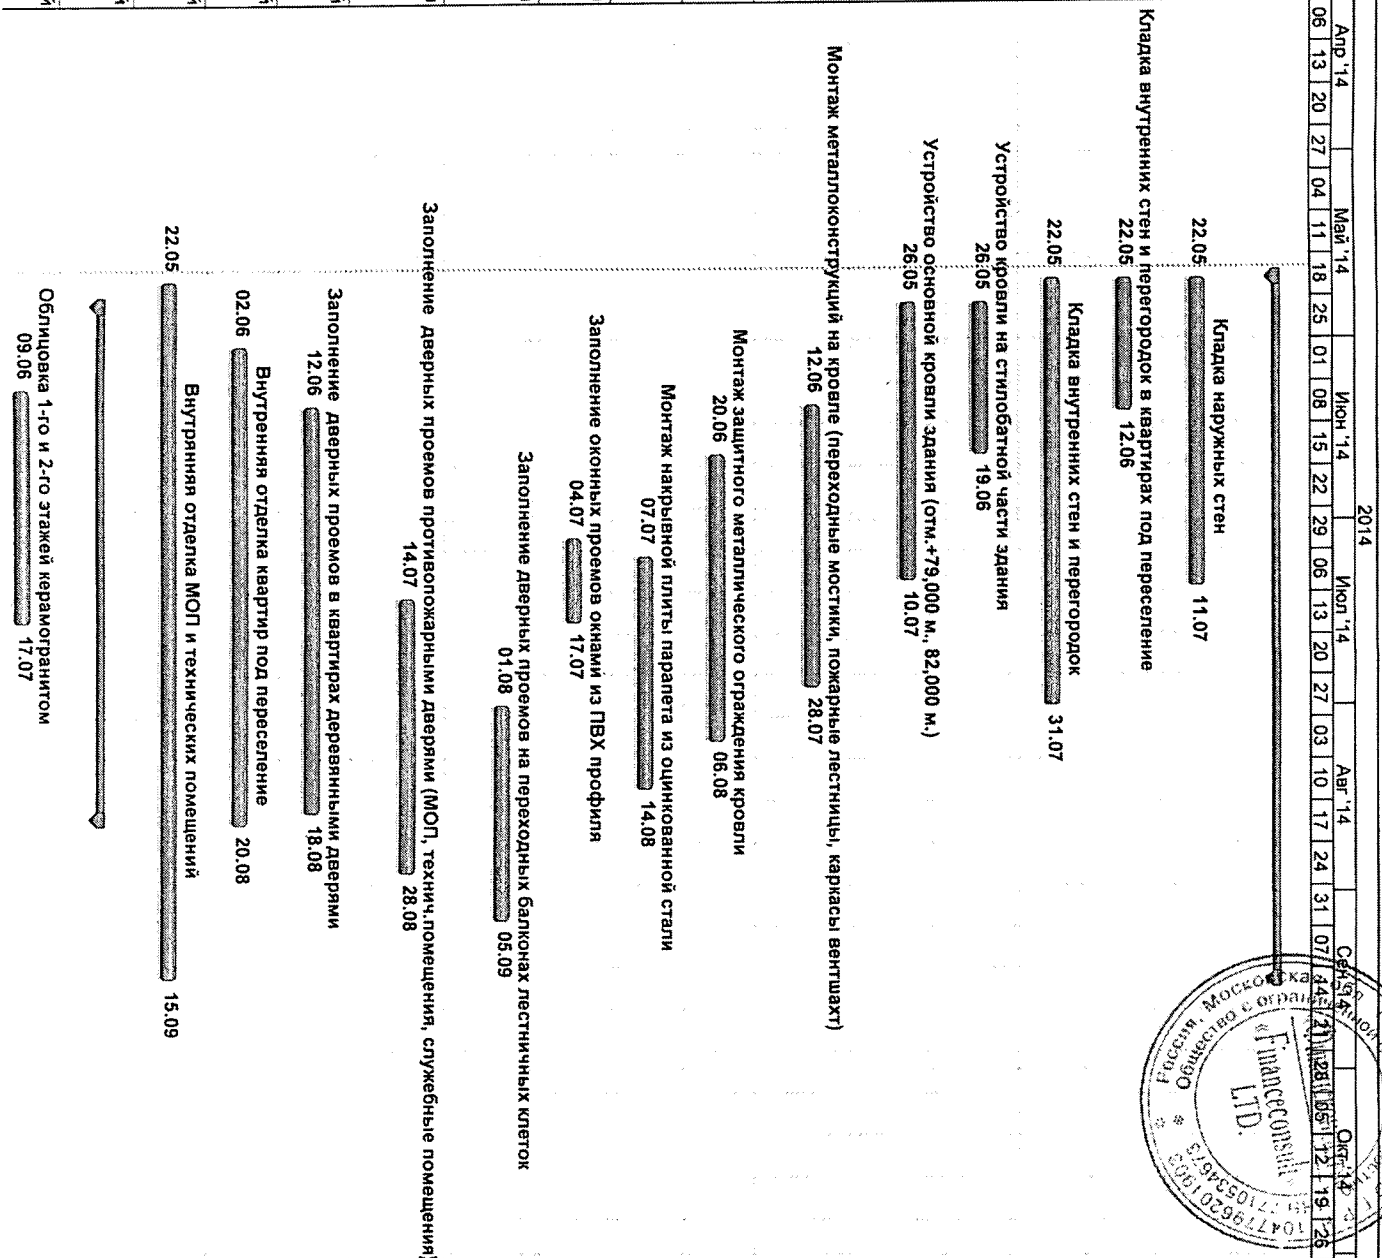

Установка внешних и внутренних систем "АВАНГРД", с устройством притяжаний и обрамлений	11.09.14	01.10.14	30 дней
Металлические ограждения наружных балконов	Пн 02.06.14	Чт 10.07.14	30 дней
Устройство "мокрого фасада"	Пн 26.05.14	Пт 25.07.14	47 дней
Монтаж лифтового оборудования	Пн 12.05.14	Пт 19.09.14	97 дней
Подготовка лифтовых шахт к монтажу лифтового оборудования	Пн 12.05.14	Чт 03.07.14	40 дней
Монтаж лифтового оборудования	Вт 10.06.14	Пт 19.09.14	76 дней
Тренинг инженерные сети, коммуникации оборудование	Пн 19.05.14	Ср 24.09.14	95 дней
Подготовка и пуск ИТП к отопительному сезону	Пт 05.09.14	Ср 24.09.14	14 дней
Насосная	Пн 16.06.14	Ср 09.07.14	18 дней
Водомерный узел	Пн 16.06.14	Пт 27.06.14	10 дней
Электрооборудование и электроосвещение	Пн 19.05.14	Ср 10.09.14	85 дней
Отопление и теплоснабжение	Чт 22.05.14	Ср 10.09.14	82 дней
Водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация	Чт 22.05.14	Ср 10.09.14	82 дней
Вентиляция и система дымоудаления	Чт 22.05.14	Ср 10.09.14	82 дней
Слаботочные системы: автоматика, диспетчеризация, охранно-пожарная сигнализация, ОДС,СКУД и т.д. конструкторские работы	Пн 09.06.14	Ср 10.09.14	70 дней
Конструкторские работы	Чт 11.09.14	Ср 24.09.14	10 дней
Монтаж наружного освещения	Пн 30.06.14	Ср 24.09.14	64 дней
Благоустройство и озеленение территории	Пн 09.06.14	Ср 24.09.14	80 дней
Ива объекта и получение ЗОС	Ср 24.09.14	Вт 30.09.14	5 дней

Установка внешних и внутренних систем "АВАНГРД", с устройством притяжаний и обрамлений

13.06 — 19.08

Металлические ограждения наружных балконов  
02.06 — 10.07

Устройство "мокрого фасада"  
26.05 — 25.07

Подготовка лифтовых шахт к монтажу лифтового оборудования  
12.05 — 03.07

Монтаж лифтового оборудования  
10.06 — 19.09

Подготовка и пуск ИТП к отопительному сезону  
05.09 — 24.09

Насосная  
16.06 — 09.07

Водомерный узел  
16.06 — 27.06

Электрооборудование и электроосвещение  
19.05 — 10.09

Отопление и теплоснабжение  
22.05 — 10.09

Водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация  
22.05 — 10.09

Вентиляция и система дымоудаления  
22.05 — 10.09

Слаботочные системы: автоматика, диспетчеризация, охранно-пожарная сигнализация, ОДС,СКУД и т.д.  
09.06 — 10.09

Конструкторские работы  
11.09 — 24.09

Монтаж наружного освещения  
30.06 — 24.09

Благоустройство и озеленение территории  
09.06 — 24.09

Ива объекта и получение ЗОС  
24.09 — 30.09

В

Проверил:

Маракаткин Г.А.
